



***Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ścianach wewnętrznych nawy głównej”, w kościele p/w Wniebowzięcia NMP należącym do zespołu sakralnego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.***

KOSZTY CAŁKOWITE: 120 00,00 złotych

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (80.000,00 złotych);

dotacja Urzędu Miasta Sierpc (30 000,00 złotych);

wkład własny (10 000,00 złotych).


W ramach zakończonych prac konserwatorsko-restauratorskich przy ścianach wewnętrznych nawy głównej (II etap końcowy), wykonano szereg zabiegów konserwatorskich polegających m.in. na:

poszerzeniu badań stratygraficznych, dezynfekcji powierzchni ścian, oczyszczeniu z zabrudzeń oraz luźnych nawarstwień, usunięciu oraz ścienieniu niewłaściwych uzupełnień po remontach, lokalnym odsalaniu oraz usunięciu zasolonych tynków, miejscowym wzmocnieniu strukturalnym oraz podklejeniu odspojonych tynków, podklejeniu luźnych fragmentów warstw farb, uzupełnieniu lokalnie usuniętych, zasolonych tynków, uzupełnieniu pęknięć oraz ubytków tynku, malowaniu ścian wewnętrznych (w technice żolowo-krzemianowej), uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej w partii dekoracji malarskich.

## ZDJĘCIA POWYKONAWCZE:



**Widok ogólny, ściana wschodnia, prezbiterium**

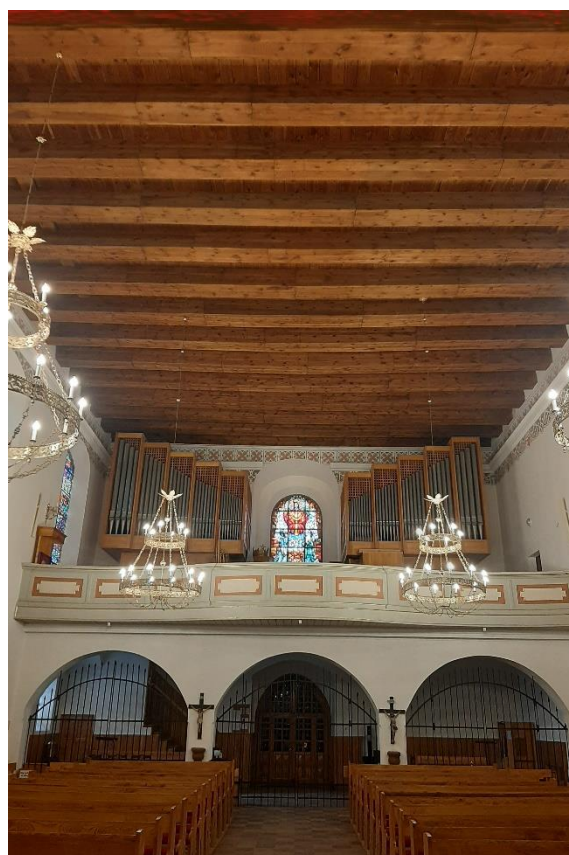

**Widok ogólny, ściana zachodnia, chór kościoła**



**Ściana południowa**



**Fragment wnętrza nawy głównej**



**Ornament dolny pół**



**Malowidła na ścianie południowej**
